



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

La Dirección de Infraestructura de la Alcaldía del Municipio Baruta es el órgano municipal responsable de controlar y ejecutar la construcción, conservación y mejoras de las obras civiles y servicios públicos en los sectores del Municipio, dentro de los lineamientos contenidos en los instrumentos de marco legal vigente en materia de construcción, a fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio. Este propósito se logra a través de la ejecución y manejo de los recursos destinados a la realización de Estudios Proyectos y Ejecución de Obras de Construcción y Mantenimiento dentro del Municipio. Para ello, posee una División de Construcción, una División de Mantenimiento, una División de Estudios y Proyectos, así como la División de Apoyo a los procesos de contratación de obras, la División de Contrataciones y la División de Apoyo Administrativo.

CONSIDERACIONES:

La Dirección de Infraestructura de la Alcaldía de Baruta, durante el ejercicio fiscal 2010, contó con un Presupuesto Inicial aprobado de Bs. 193.487.978,00, para la ejecución de sus actividades durante dicho período.

Durante el año 2010 se realizaron algunas modificaciones al Presupuesto Inicial, resaltando la eliminación de setenta y un (71) Obras por un monto de Bs. 38.932.366,00 y la incorporación al Presupuesto de nuevas obras y proyectos necesarios para atender emergencias en algunas zonas municipales, lo cual produjo la aprobación de cuarenta y dos (44) Créditos Adicionales para Obras de Construcción e Inspecciones y de once (11) Créditos para Estudios y Proyectos, lo cual totaliza Bs. 34.577.984,63 en recursos adicionales aprobados.

En relación a lo anterior, el Presupuesto ejecutado en 2010 por la Dirección de Infraestructura tuvo un total de trescientos diez (310) Obras y/o Proyectos, por un monto total asignado de Bs. 175.867.381,00, tal como se aprecia a continuación:


Cuadro N° 11-07.I: Relación entre obras previstas , obras contratadas y no contratadas, Año 2010

	Total metas planteadas en el POA 2010	Obras contratadas	Obras que no fueron contratadas en el 2010	% Logrado
División de Construcción	208	195	13	93,75
División de Mantenimiento	28	28	0	100
División de Proyectos	87	87	0	100
TOTAL	323	310	13	95,98



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Grafico N° 11-07.I: Metas previstas, contratadas y no contratadas, Año 2010

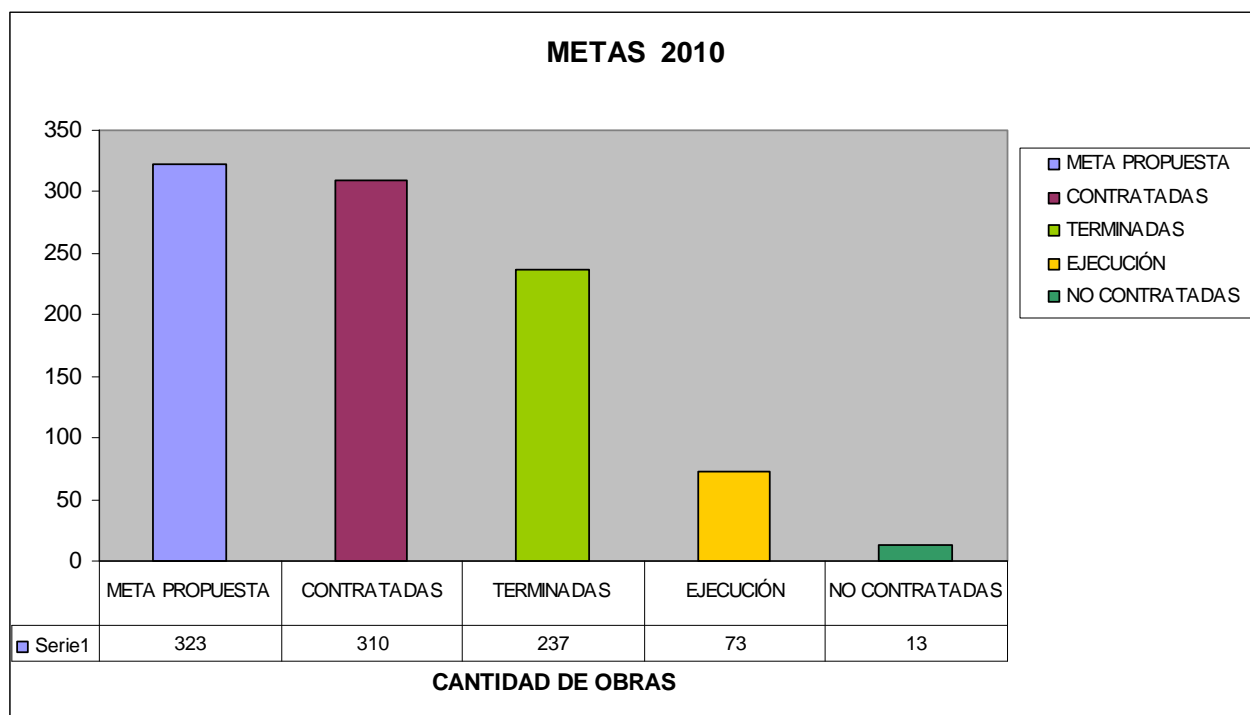

Fuente: Dirección de Infraestructura




Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Cuadro N° 11-07.II: Obras y proyectos finalizados en 2010

CATEGORIA	META	TERMINADAS	% DE METAS LOGRADAS
Obras de Construcción	195	122	62,56
Obras de Mantenimiento	28	28	100
Proyectos	87	87	100
TOTAL	310	237	76,45

Grafico N° 11-07.II: Obras y proyectos finalizados en 2010

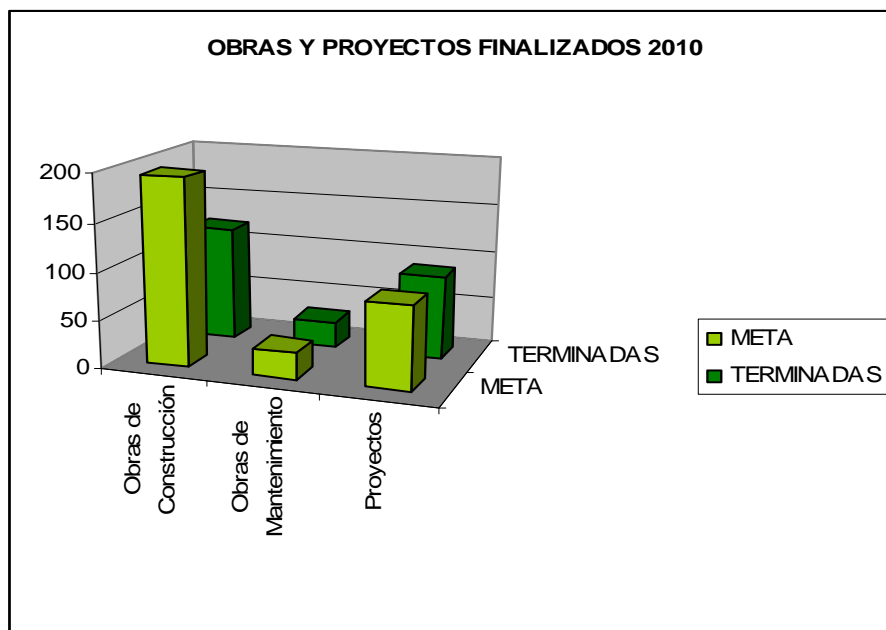

Fuente: Dirección de Infraestructura

En cuanto al Presupuesto Participativo, el mismo correspondió al 37% del Presupuesto Total, para un total de Bs. 37.671.200,00, asignados a la Dirección y discriminado de la siguiente manera:



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura


Cuadro N° 11-07.III : Asignaciones del Presupuesto Participativo, Año 2010

Presupuesto Participativo	No contratados	Terminados	En Ejecución
Obras	5	37	33
Proyectos	0	40	0
TOTAL	5	77	33

Cuadro N° 11-07.IV : Porcentaje de Obras del Presupuesto Participativo, Año 2010

	CANTIDAD	%
TOTAL OBRAS Y/O PROYECTOS PARTICIPATIVOS	115	37,10
TOTAL OBRAS Y/O PROYECTOS CONTRATADOS 2010	310	100

Gráfico N° 11-07.III: Obras y proyectos finalizados en 2010

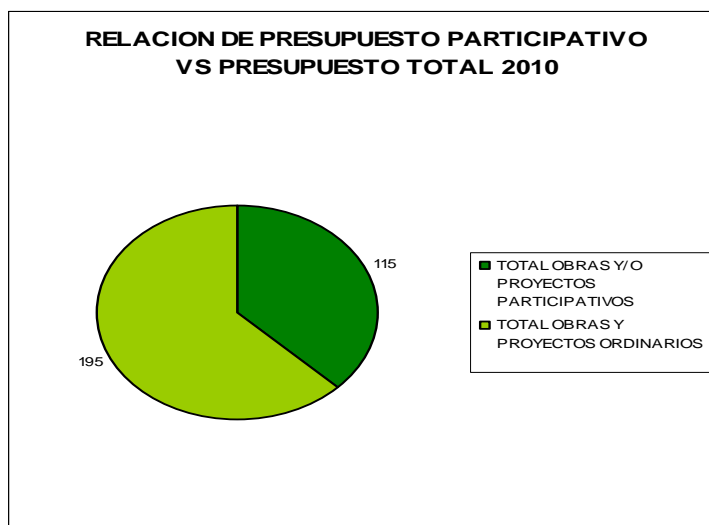

Fuente: Dirección de Infraestructura



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

Cabe señalar que el siguiente grupo de obras no fueron efectivamente contratadas y ejecutadas durante el 2010:

Cuadro N° 11-07.V: Obras No Contratadas en el año 2010

N°	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2010 Gasto (Bs.)	FUENTE FINANCIAMIENTO
1	10-58	Reestructuración de las Escaleras. Santa Cruz Del Este, Callejón San Pedro. Presupuesto Participativo.	178.571	PARTICIPATIVO
2	10-59	Reestructuración de las Escaleras. Santa Cruz Del Este, Callejón El Gimnasio. Presupuesto Participativo.	178.571	PARTICIPATIVO
3	03-08	Reconstrucción del pavimento y alcantarillado calle 1. Zona Industrial. La Naya. Presupuesto participativo. FIDES	714.286	PARTICIPATIVO
4	04-23	Reparación de aguas servidas, sector Las Dalias. Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo.	267.857	PARTICIPATIVO
5	08-21	Sustitución del Colector o Drenaje del Callejón Puntuyo. Santa Cruz Sector Los Guirenos. Presupuesto Participativo.	267.857	PARTICIPATIVO
		SUBTOTAL	1.607.142	
6	INSP-03	Inspección de la Obra Construcción de Edificación de Punto de Transferencia de Desechos Sólidos Urbanos, en la Av. Río Paragua, Sector Santa Cruz del Este. (4.04.14.01.00)	204.802	ORDINARIO
7	02-05	Restitución del sistema de drenajes en el colector en la calle El Guamal hasta la calle Carrizal, Lomas de La Trinidad	1.187.500	ORDINARIO
8	04-12	Conservación, ampliación y mejoras de drenajes y aguas servidas en la calle A Urb. Santa Rosa de Lima.	982.143	ORDINARIO
9	08-08	Construcción de tubería de drenajes, desde la Av. Las Esmeraldas hasta la Quebrada La Boyera, Calle Del Gamelotal.	1.780.359	ORDINARIO
			4.154.804	
10	03-81	Repavimentación vial en la Av. Río de Janeiro, Urb. Las Mercedes. PLUSVALIA	2.408.896	PLUSVALÍA
11	04-19	Conservación y mejoras de las áreas de la Plaza Alfredo Sadel, Urb. Las Mercedes. PLUSVALIA	535.714	PLUSVALÍA
12	10-01	Construcción y reparaciones de aceras en la Urb. Los Naranjos de Las Mercedes. PLUSVALIA	625.000	PLUSVALÍA
13	10-03	Suministro, transporte y colocación de Bolardos en la Urb. Las Mercedes. PLUSVALIA	500.000	PLUSVALÍA
		SUBTOTAL	4.069.610	
		TOTAL OBRAS NO CONTRATADAS EN EL 2010	9.831.556	



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

Fuente: Dirección de Infraestructura

El porcentaje de ejecución de obras y/o proyectos de la Dirección de Infraestructura del Municipio Baruta sobre la base de obras efectivamente contratadas es de un 96 % (aprox), ejecutando en su totalidad un 76% (aprox) de las mismas.

DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Esta división se encarga de garantizar el cumplimiento de la programación estimada en materia de servicios, a través de la ejecución de obras civiles y de servicio al público, siguiendo los lineamientos establecidos por la Dirección en materia de construcción y de servicios de obras públicas. Asimismo, es la encargada de la ejecución, supervisión y del control técnico y administrativo de las Obras Y Proyectos en el área de infraestructura, construcción, drenajes, obras públicas, vialidad, plazas, parques, obras hidráulicas y estabilización de taludes.

La ejecución de las metas estimadas durante el 2010 para la División de Construcción se describe a continuación:


Cuadro N° 11-07.VI: Obras de la División de Construcción en el año 2010

TOTAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	CANTIDAD	MONTO (BS.)
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN	73	78.419.026,00
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS	122	75.981.292,00
INSPECCIONES EN EJECUCIÓN	02	1.601.250,00
TOTAL	195	156.001.568,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Gráfico N° 11-07.IV: Porcentaje de Ejecución

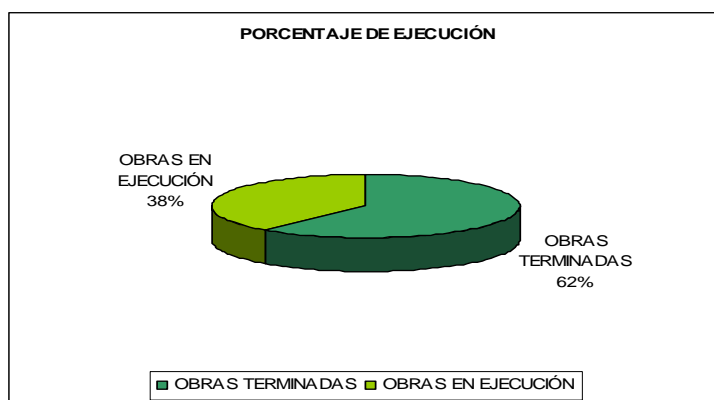

Fuente: Dirección de Infraestructura


Cuadro N° 11-07.VII: Obras de la División de Construcción Financiadas por Presupuesto Participativo, 2010

DETALLE DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CANTIDAD	MONTO (EN Bs.)
OBRAS TERMINADAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	38	18.254.208,00
OBRAS EN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	30	15.152.441,00
TOTAL	68	33.406.649,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Gráfico N° 11-07.V: Metas del Presupuesto Participativo

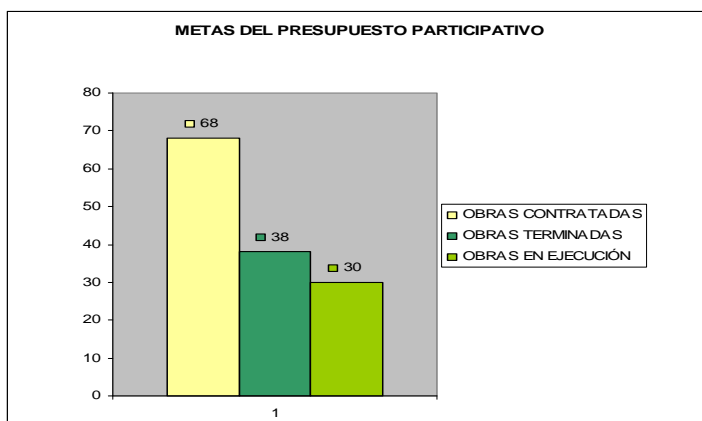

Fuente: Dirección de Infraestructura

Cuadro N° VIII : Obras de la División de Construcción Financiadas por FIDES-LAEE, 2010

DETALLE / OBRAS FIDES - LAEE	CANTIDAD	MONTO EN BS
OBRAS TERMINADAS DEL PRESUPUESTO FIDES	8	5.821.703,00
OBRAS TERMINADAS DEL PRESUPUESTO LAEE	5	4.283.036,00
SUB-TOTAL	13	10.104.739,00
OBRAS EN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FIDES	10	7.093.861,00
OBRAS EN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO LAEE	3	3.615.364,00
SUB-TOTAL	13	10.709.225,00

Fuente: Dirección de Infraestructura

Cuadro N° IX: Beneficios a la Comunidad, 2010

BENEFICIOS A LA COMUNIDAD	CANTIDAD
TOTAL EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	7800
TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS	23.400
URBANIZACIONES BENEFICIADAS	73
POBLACIÓN BENEFICIADA	500.000 Hab

Fuente: Dirección de Infraestructura



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

Cuadro N° X: Créditos Adicionales Aprobados, 2010

	CANTIDAD	MONTO
CRÉDITOS ADICIONALES SOLICITADOS Y APROBADOS PARA OBRAS	40	28.063.181,70
CRÉDITOS ADICIONALES SOLICITADOS Y APROBADOS PARA INSPECCIONES	04	4.862.426,00
TOTAL	44	32.925.607,70

Fuente: Dirección de Infraestructura

Cuadro N° XI: Avance Físico de Obras al 31 de Diciembre de 2010

N°	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2010 Gasto	FUENTE FINANCIAMIENTO	STATUS CONTRATACIÓ N	AVANCE FÍSICO
1	01-02	Reparación, ampliaciones y mejoras en los Parques de la Virgen y Los Coquitos entre Calles B y C de Santa Rosa de Lima.	189.000	ORDINARIO	TERMINADA	100%
2	01-03	Conservación, ampliaciones y mejoras de la Capilla San Juan, ubicada en el Sector El Progreso, vía principal Ojo de Agua.	240.601	ORDINARIO	TERMINADA	100%
3	01-05	Reparaciones, ampliaciones y mejoras en el Parque Antonio José de Sucre, Urb. Caurimare.	214.830	ORDINARIO	TERMINADA	100%
4	01-06	Conservaciones, ampliaciones y mejoras del Campo de Béisbol del Parque Aprutechi, Urb. Terrazas del Club Hípico.	84.390	ORDINARIO	TERMINADA	100%
5	01-07	Reparaciones, ampliaciones y mejoras en el Parque Infantil, Urb. Cumbres de Curumo.	123.775	ORDINARIO	TERMINADA	100%
6	01-08	Reparaciones, ampliaciones y mejoras del Parque Infantil de la Urb. La Bonita.	228.806	ORDINARIO	TERMINADA	100%
7	01-09	Remodelaciones, ampliaciones y mejoras del Complejo Deportivo de la Urb. El Placer.	687.500	ORDINARIO	TERMINADA	100%
8	01-10	Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de Cancha Deportiva en la Av. Carlos Bello, Urb. Santa Fé Norte.	289.735	ORDINARIO	TERMINADA	100%
9	01-14	Remodelaciones y mejoras en las Áreas Deportivas de diferentes sectores del Municipio	750.000	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
10	01-15	Reparaciones y mantenimiento de Unidades Educativas Municipales en el Casco de Baruta y Sector Ojo de Agua	500.000	ORDINARIO	TERMINADA	100%



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

11	01-16	Reparaciones y mantenimiento de Unidades Educativas Municipales en Sector Santa Cruz del Este y Las Minas de Baruta.	500.000	ORDINARIO	TERMINADA	100%
12	01-17	Reparaciones y mantenimiento de Unidades Educativas Municipales en Sector Hoyo de la Puerta	491.071	ORDINARIO	TERMINADA	100%
13	01-19	Construcción de entrada independiente al Módulo Policial. Calle a Urb. Santa Rosa de Lima. Presupuesto Participativo.	178.571	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
14	01-20	Refacción y Ampliación de la Sede de Organizaciones Vecinales: ASOCHUAO, Consejo Comunal de Chuao y Justicia de Paz. Presupuesto Participativo.	369.643	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
15	01-21	Reconstrucción del Módulo Policial de la calle el Rosario sector La Capilla. Baruta. Presupuesto participativo.	535.714	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
16	01-22	Reparación de Área Deportiva del Polideportivo "Boris Piñero". Santa Fe Norte. Presupuesto Participativo. FIDES	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	65%
17	01-24	Sustitución del Techo de Asbesto de las Gradas de Béisbol del Polideportivo Cesar del Vecchio. Av. Ppal. De Alto Prado. Presupuesto Participativo. LAEE	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
18	01-25	Construcción Cerca Perimetral tipo ciclón. Linderos con Las Minas, Urb. Coracrevi. Presupuesto Participativo.FIDES	267.857	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
19	01-23	Arreglo Polideportivo Cumbres de Curumo (arreglo general). Presupuesto Participativo.FIDES	535.714	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
20	01-26	Construcción de Cancha Deportiva Múltiple. Ojo de Agua, Sector La Pedrera. Presupuesto Participativo.LAEE	714.286	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
21	01-27	Remodelaciones y mejoras de la Cancha de Usos Múltiples El Güire, Sector El Güire. LAEE	750.000	ORDINARIO	TERMINADA	100%
22	01-28	Remodelaciones y mejoras en Unidades Educativas Municipales y Preescolares en diferentes sectores del Municipio	508.929	ORDINARIO	TERMINADA	100%
23	01-29	Recuperación del Parque Trini y sede de ASOVETRI. Calle del Arenal, Urb. La Trinidad. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	15%
24	1-30	Construcción de Cerca Perimetral en el Parque las Brujas, Urb. Santa Clara. Presupuesto Participativo	13.829	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
25	1-31	Reparaciones y Mejoras en la Casa de la Cultura Oswaldo Pérez Perazzo, Municipio Baruta.	356.411	ORDINARIO	TERMINADA	100%
26	1-32	Desmantelamiento y Demolición de 06 Viviendas en el Barrio las Minitas, Municipio Baruta.	142.023	ORDINARIO	TERMINADA	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

27	02-01	Canalización de la Quebrada La Boyera, entrada Calle Gamelotal y Res. Alto Ángel, conexión con el Embaulamiento existente.	1.785.714	ORDINARIO	EJECUCIÓN	15%
28	02-02	Canalización de la Quebrada Sartenejas, frente a los Bloques de La Trinidad. LAEE	1.773.749	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
29	02-03	Continuación de la canalización de la Quebrada Ojo de Agua.	1.773.749	ORDINARIO	TERMINADA	100%
30	02-04	Construcción de Canal en la Quebrada Sartenejas, frente al Banco Mercantil, sector Sorocaima.	500.000	ORDINARIO	TERMINADA	100%
31	03-05	Asfaltado de las Calles Intermedias del Sector Santa Ana. El Cafetal. Presupuesto Participativo.FIDES	726.786	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
32	03-06	Repavimentación de la Avda Principal y Calles de la Urbanización de Santa Marta. El Cafetal. Presupuesto Participativo. FIDES	586.607	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	90%
33	03-07	Culminación del Asfaltado de las Avdas. AC - A de la Urbanización Caurimare. Presupuesto Participativo.	726.786	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
34	03-09	Repavimentación de la calle Manaure. Guaicay. Presupuesto participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
35	03-10	Recuperación y rehabilitación de la vía alterna del colegio Bárbaro Rivas (pavimento en concreto). Urb. El Rosario. Presupuesto Participativo. FIDES	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
36	03-11	Repavimentación vial en Av. Principal De San Luís, Urb. San Luís.	942.056	ORDINARIO	TERMINADA	100%
37	03-12	Asfaltado de las vías y demarcación. Urb. Santa Rosa de Lima. Presupuesto participativo.	535.714	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
38	03-13	Repavimentación vial en la Avenida Intercomunal de El Hatillo. FIDES.	1.436.915	ORDINARIO	TERMINADA	100%
39	03-14	Repavimentación vial en la Av. Caurimare y Ramales de Colinas de Bello Monte. FIDES.	1.604.429	ORDINARIO	TERMINADA	100%
40	03-15	Repavimentación vial en la Av. Principal de Valle Arriba.	1.092.835	ORDINARIO	TERMINADA	100%
41	03-16	Repavimentación vial en avenidas San Juan, San Rafael Y Santa Isabel. Parcelamiento San Juan, Urb. Santa Fe Norte.	600.582	ORDINARIO	TERMINADA	100%
42	03-17	Repavimentación vial en Lomas de Colinas de Bello Monte. (Límite con Municipio Libertador).	182.208	ORDINARIO	TERMINADA	100%
43	03-18	Repavimentación vial en Av. Principal, Calles Acueducto, La Ceiba y Coquivacoa, Urb. El Peñón.	1.389.186	ORDINARIO	TERMINADA	100%
44	03-19	Repavimentación vial en Av. Principal de Hoyo de La Puerta.	572.090	ORDINARIO	TERMINADA	95%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

45	03-21	Repavimentación vial en la Av. La Colina, Urb. Los Samanes.	715.573	ORDINARIO	TERMINADA	100%
46	03-22	Repavimentación vial en Calle Gamelotal, Urb. Las Esmeraldas.	170.721	ORDINARIO	TERMINADA	100%
47	03-23	Repavimentación vial en Calle Guayabal de la Urb. La Tahona.	42.514	ORDINARIO	TERMINADA	100%
48	03-24	Rehabilitación en concreto en el Sector Boquerón, Manantiales de La Campiña, Hoyo de La Puerta. I Etapa.	479.317	ORDINARIO	TERMINADA	100%
49	03-25	Repavimentación vial en la Urb. La Bonita, Av. Principal desde el semáforo C/A, Guaicay hasta el Puente La Bonita. I ETAPA.	487.078	ORDINARIO	TERMINADA	100%
50	03-26	Repavimentación vial en Av. Orinoco desde el límite del Municipio Libertador hasta la intersección con Calle Suapure, Colinas de Bello Monte.	85.971	ORDINARIO	TERMINADA	100%
51	03-27	Repavimentación vial en Alto Prado.	1.116.631	ORDINARIO	TERMINADA	100%
52	03-29	Repavimentación vial en Av. Paso Real, Prados del Este.	958.760	ORDINARIO	TERMINADA	100%
53	03-30	Repavimentación vial en Av. Circunvalación del Sol, Urb. Santa Paula.	131.364	ORDINARIO	TERMINADA	100%
54	03-32	Repavimentación vial en la Calle B de la Urb. Guaicay.	62.479	ORDINARIO	TERMINADA	100%
55	03-33	Repavimentación vial en las calles: Bolívar Norte y Sur, Sucre, Anacoco, Federación, Victoria, Los Mangos Y Colegio Americano de las Minas	1.961.041	ORDINARIO	TERMINADA	100%
56	03-34	Repavimentación vial en las Calles: San Joaquín, Santa Ana, Santa Elena, Macareo, La Tejería, Socuy y El Arenal, Urb. Lomas de La Trinidad.	622.707	ORDINARIO	TERMINADA	100%
57	03-37	Rehabilitación vial en la entrada de la Urb. Las Danielas en la Calle El Colegio. Las Minas.	512.022	ORDINARIO	TERMINADA	100%
58	03-38	Repavimentación vial de la Urb. Terrazas de Club Hípico, Parque Humboldt y Brisas del Prado.	527.703	ORDINARIO	TERMINADA	100%
59	03-39	Rehabilitación en concreto en la Calle El Colegio, El Güire.	371.756	ORDINARIO	TERMINADA	100%
60	03-40	Repavimentación vial en la Calle Unión y Av. Río Paragua de Santa Cruz del Este.	212.523	ORDINARIO	TERMINADA	100%
61	03-41	Repavimentación vial desde prolongación de la Av. Principal de Santa Inés hasta Fesvial.	866.615	ORDINARIO	TERMINADA	100%
62	03-42	Repavimentación vial en Calle San Cristóbal, Sector La Pared de Hoyo de La Puerta. II Etapa.	1.371.510	ORDINARIO	EJECUCIÓN	90%
63	03-43	Asfaltado Calle San Félix de Urb. Santa Clara del Cafetal. Presupuesto Participativo.	325.000	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

64	03-44	Pavimentación Calle San Luís. Urb. San Luís. El Cafetal. Presupuesto Participativo.	726.786	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
65	03-45	Reparación del tramo la capilla entre el callejón los Samanes y el Módulo Policial. Urb. El Rosario. Presupuesto participativo. FIDES	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
66	03-48	Asfaltado de la calle 12 y 15 de la Urb. Los Samanes. Presupuesto participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	20%
67	03-49	Arreglo de la calle principal la Coromoto. Las Minas. Presupuesto participativo. FIDES	714.286	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	40%
68	03-51	Arreglo y construcción de calles de la primera transversal El Rosario. Presupuesto participativo. FIDES	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
69	03-52	Repavimentación Calle Suapure, desde Embajada Americana hasta cruce con Calle Guatire y Ramal 2, Colinas de Bello Monte. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
70	03-53	Recuperación de Capa Asfáltica y hundimiento de la Calle Chulavista. Urb. Chulavista. Presupuesto Participativo.	535.714	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
71	03-54	Reconstrucción de la Calle Los Mangos. Las Dalías, Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo. FIDES	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
72	03-55	Asfaltado de la Calle la Ceiba (entrada al sector Sta Gertrudis). Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	100%
73	03-56	Asfaltado Completo de la Calle Este y Oeste de Manzanares. Presupuesto Participativo.	714.286	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
74	03-57	Repavimentación de Tramo Faltante de Avda El Parque. Prados del Este. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
75	03-58	Repavimentación de Tramo Faltante de la Calle Amazonas. Prados del Este. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
76	03-60	Reparación de las Vías Calle Venezuela Las Américas - Colombia - Perú - Las Repúblicas. Terrazas Club Hípico. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
77	03-62	Asfaltado Calle La Lechuza. Calle La Lechuza, Urb. Altos De Monterrey. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
78	03-63	Recuperación de Asfaltado en la Urb. Piedra Azul. Presupuesto Participativo. FIDES	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	100%
79	03-64	Acondicionamiento de Carpeta Asfáltica. Calles Internas: A, C Y Av. Ppal. Urb. Montealto. Presupuesto Participativo. LAEE	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
80	03-65	Repavimentación de la Calle Santa Elena. Urb. La Trinidad. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
81	03-66	Asfaltado de Calles Juan Iturbe Norte y Sur. Urb. Sorocaima. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

82	03-67	Pavimentación. Calle La Tejería Entre Calles El Guamal Y Calle Los Peñones, Urb. Lomas De La Trinidad. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
83	03-68	Repavimentación de Calles. Urb. El Placer. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
84	03-69	Rehabilitación en Concreto Rampa de Acceso. Callejón Polar El Placer De Maria. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
85	03-70	Rehabilitación de la Vialidad. KM 13 Autopista Regional Del Centro, El Campito. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
86	03-71	Repavimentación de las Calles. Urb. La Bonita. Presupuesto Participativo.	815.734	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
87	03-72	Sustitución del Concreto de la Prolongación Calle Páez vía La Palomera. Piedras Pintadas. La Palomera Baruta. Presupuesto Participativo. FIDES	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
88	03-73	Asfaltado. Parte Alta De La Planada, Hoyo De La Puerta. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
89	03-74	Asfaltado. Piedras Azules. Presupuesto Participativo.FIDES	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	25%
90	03-75	Pavimentación de Primera Calle Sector Los Manantiales. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	45%
91	03-76	Pavimentación. La Loma Sector Campamento. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	55%
92	03-77	Pavimentación de toda La Calle del Medio. San Luís. Hoyo La Puerta. Presupuesto Participativo.	1.160.469	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	92%
93	03-78	Reparación del Pavimento. Av. Principal Entre La Pared y La Morgado. Hoyo La Puerta. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	95%
94	03-79	Asfaltado al Final de la Avenida Principal en San Luís Parte Alta. Hoyo de la Puerta. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	80%
95	03-80	Continuación de Asfaltado en la Calle Zarsa. Valle La Pared. Urb. Valle Verde. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	55%
96	03-82	Asfaltado Calle Sagitario: Urb. Santa Paula. Presupuesto Participativo.	892.857	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
97	03-86	Asfaltado calle Upata Sector Santa Clara del Cafetal. Presupuesto Participativo.	404.101	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
98	03-87	Repavimentación Vial en Av. Principal de la Urb Santa Ana, El Cafetal.	98.031	ORDINARIO	TERMINADA	100%
99	03-88	Repavimentación Vial de Calle A, entre entrada A y C de la Urb. Caurimare.	83.001	ORDINARIO	TERMINADA	100%
100	03-89	Repavimentación vial en la Urb. Las Mercedes	2.410.714	ORDINARIO	EJECUCIÓN	75%
101	03-90	Rehabilitación Vial en Av. La Esmeralda Urb. La Tahona	1.629.908	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

102	03-91	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Calles y Avenidas en Diferentes Localidades del Municipio Baruta.	1.159.573	ORDINARIO	TERMINADA	100%
103	04-13	Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas en la Calle La Ceiba y Coquivacoa, Urb. El Peñón	437.500	ORDINARIO	TERMINADA	100%
104	04-17	Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas en Urb. Santa Paula	446.429	ORDINARIO	TERMINADA	100%
105	04-18	Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas en la Urb. La Bonita	437.500	ORDINARIO	TERMINADA	100%
106	04-20	Reconstrucción de del canal marginal de la Quebrada Las Mercedes. I Etapa. FIDES	2.410.714	ORDINARIO	EJECUCIÓN	52%
107	04-24	Reparación y Ampliación del Área de Colocación de los Contenedores de Basura, Reparación de Bordes y Aceras y Reparación de torrentera en Calle Paseo Guaicaipuro, Inicio escalera Nro. 2, El Placer de María. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
108	04-27	Construcción de redes de Drenjes en la Urb. Las Mercedes	3.571.429	ORDINARIO	EJECUCIÓN	40%
109	04-35	Conservación y Mejoras de un tramo del colector de drenajes ubicado en la Av. Carlos Bello, Urb. Santa Fe Norte.	273.510	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
110	05-01	Construcción del Gimnasio Vertical en Santa Cruz del Este. (4.04.99.01.00).	4.859.546	ORDINARIO	EJECUCIÓN	70%
111	05-02	Construcción del Centro de Protección y Control Animal (CEPROCAN). II ETAPA. (4.04.15.01.00).	1.039.160	ORDINARIO	EJECUCIÓN	80%
112	05-04	Construcción de Edificación de Punto de Transferencia de Desechos Sólidos Urbanos, en la Av. Río Paragua, Sector Santa Cruz del Este.	3.519.337	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
113	07-01	Construcción y Mejoras de la Plaza Raúl Leoni en la Urbanización el Cafetal.	314.112	ORDINARIO	EJECUCIÓN	80%
114	08-02	Construcción de drenajes en la Urb. Los Guayabitos	982.143	ORDINARIO	EJECUCIÓN	60%
115	08-03	Construcción de Drenajes de Aguas Negras en la Escalera N°. 1 de San Pedrito y Sector Las Manzanas.	472.616	ORDINARIO	TERMINADA	100%
116	08-05	Construcción de colector de aguas de lluvias y calzada en la Calle El Colegio, Sector El Progreso.	1.250.000	ORDINARIO	TERMINADA	100%
117	08-07	Construcción de drenajes en el Sector El Progreso.	1.250.000	ORDINARIO	TERMINADA	100%
118	08-10	Construcción de Torrentera Principal al final de Calle Los Manriques, Hoyo de La Puerta	669.643	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

119	08-11	Construcción de alcantarillado para recolección de aguas de lluvias que se desbordan, por las veredas El Pozo y Los Mangos, proveniente de la Calle El Rosario, Las Minas de Baruta. FIDES	614.395	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
120	08-12	Construcción para la adecuación de redes de acueductos cloacas y drenajes en La Palomera. I Etapa. LAEE.	1.395.186	ORDINARIO	EJECUCIÓN	35%
121	08-22	Tubería de Aguas Servidas. Escaleras del Carmen, El Placer de María. Presupuesto Participativo. FIDES	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	100%
122	08-24	Obra para el control de drenajes superficiales y subterráneos en la Av. Principal en la Urb. San Luís.	491.071	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
123	08-27	Construcción de Torrentera, calle Icabaru, Urb. Colinas de Bello Monte	491.072	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
124	09-01	Estabilización de falla de borde en Av. Principal de Los Guayabitos, Sector El Volcán.	1.488.035	ORDINARIO	EJECUCIÓN	10%
125	09-02	Estabilización de talud en la entrada a la Res. Las Danielas, Las Minas de Baruta	2.509.833	ORDINARIO	TERMINADA	100%
126	09-03	Estabilización de talud en calle Ticoporo, La Ciudadela	2.398.749	ORDINARIO	TERMINADA	100%
127	09-04	Estabilización de falla de borde calle Río La Paragua hacia la Av. Ppal. De Cumbres de Curumo afectando las Res. Montecarlo, Urb. Cumbres de Curumo. II Etapa	982.143	ORDINARIO	EJECUCIÓN	25%
128	09-05	Estabilización de talud en calle Toledo, Qta. Curimagua, Urb. Colinas de Tamanaco	1.607.143	ORDINARIO	EJECUCIÓN	45%
129	09-08	Estabilización de Talud y canalización de desagüe del Campo Deportivo del Estadio del Colegio de Médicos. Calle T. Urb. Colinas de Valle Arriba. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
130	09-10	Estabilización de talud en Terrazas de Santa Inés.	4.754.917	ORDINARIO	TERMINADA	100%
131	09-13	Estabilización de falla de borde en la Carretera de la Zona Industrial La Arenera, Ojo de Agua.	2.357.738	ORDINARIO	EJECUCIÓN	40%
132	09-14	Construcción de Muro de Concreto en la Calle Guara. Urb. Coracrevi. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
133	09-15	Estabilización de talud y construcción de muro Av. San Sebastián. Cementerio de Baruta.	309.065	ORDINARIO	TERMINADA	100%
134	09-16	Construcción de un Muro de Contención Calle Principal, Sector Pueblo Nuevo. La Loma De Baruta. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
135	09-17	Estabilización de talud ubicado en el Sector Anacoco, Calle La Pedrera detrás de la Funeraria Las Minas	500.000	ORDINARIO	EJECUCIÓN	75%
136	09-18	Estabilización de talud en parte posterior de la Junta Parroquial de El Cafetal	1.250.000	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

137	09-19	Estabilización de falla de borde en Av. Principal de Lomas del Mirador frente a la Qta. Palafito, Urb. Lomas del Mirador.	1.988.035	ORDINARIO	TERMINADA	100%
138	09-20	Estabilización de Taludes a lo Largo del Boulevard el Cafetal. Presupuesto Participativo- LAEE	586.607	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
139	09-22	Estabilización de talud en Calle San Juan en la Urb. Santa Fe Norte. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	1.797.673	ORDINARIO	TERMINADA	100%
140	09-23	Estabilización de talud en la Avenida Principal de la Urbanización Parque Humboldt, La Ciudadela. I Etapa.	674.312	ORDINARIO	TERMINADA	100%
141	09-24	Estabilización de talud en Calle El Tocuyo con Calle Caicara, Colinas de Bello Monte.	640.991	ORDINARIO	TERMINADA	100%
142	09-25	Estabilización de talud ubicado en el Sector Anacoco, Las Minas de Baruta.	750.000	ORDINARIO	EJECUCIÓN	80%
143	09-26	Estabilización de falla de borde y construcción de drenajes en Calle Luisa Cáceres de Arismendi y Calle El Milagro, Sector Hoyo de La Puerta.	1.875.000	ORDINARIO	EJECUCIÓN	40%
144	09-27	Continuación de la estabilización de talud, en Calle Los Mangos, Urb. Manzanares, Sector Popular.	750.000	ORDINARIO	EJECUCIÓN	65%
145	09-29	Reparación de falla de borde en Calle Río Paragua hacia la Av. Principal, afectando las Res. Monteclaro, Urb. Cumbres de Curumo	2.312.500	ORDINARIO	EJECUCIÓN	75%
146	09-30	Estabilización de talud en Áreas Verdes Municipal en Av. Santa Isabel, Urb. Santa Fé Norte. LAEE	1.785.714	ORDINARIO	TERMINADA	100%
147	09-31	Estabilización de talud en zona Verde Municipal entre la Av. Rafael Rangel y Av. Felipe Guevara Rojas, Urb. Santa Fé Norte	576.531	ORDINARIO	TERMINADA	100%
148	09-32	Reparación de falle de borde en Ruta C - Bis, Urb. Los Campitos	1.785.714	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
149	09-33	Estabilización de talud posterior Qta. Yolandita, Calle Margarita Prados del Este	1.607.143	ORDINARIO	EJECUCIÓN	90%
150	09-34	Estabilización de talud posterior del Colegio CEAPUCV y Res. Río Torbes, Calle Caurimare Ramal 3, Colinas de Bello Monte	1.607.143	ORDINARIO	EJECUCIÓN	60%
151	09-35	Estabilización de taludes en el Boulevard Raúl Leoni, Urb. Santa Paula, El Cafetal	2.232.143	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
152	09-36	Estabilización de talud entre Res. El Turpial y la Embajada del Libano, Av. Montesacro Colinas de Bello Monte	1.607.143	ORDINARIO	TERMINADA	100%
153	09-37	Estabilización de talud posterior a Res. Bosque Escondido, prolongación Av. Principal Santa Inés	1.517.857	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

154	09-38	Construcción de muro en el Canal Marginal de Las Mercedes. Municipio Baruta	446.429	ORDINARIO	TERMINADA	100%
155	09-39	Reparación Falla de Borde en la Av. Juan Negretti Malpica, Urb. La Trinidad	446.429	ORDINARIO	EJECUCIÓN	90%
156	09-40	Reparación de Falla de Borde en la Calle Guárico de Colinas de Bello Monte Decreto N° 243 Gaceta Municipal Número Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008	636.251	ORDINARIO	TERMINADA	100%
157	09-41	Estabilización de Talud en la Calle Caurimare, Urb. Colinas de Bello Monte. I Etapa. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Número Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008	1.697.622	ORDINARIO	TERMINADA	100%
158	09-42	Reparación de Falla de Borde en la Calle santa Inés, Urb. Santa Inés II Etapa	1.469.897	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
159	09-43	Reparación de Falla de Borde ubicada en la carretera Sartenejas vía Hoyo de la Puerta.	615.355	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
160	09-44	Reparación de Falla de Borde y Construcción de Muro enrocado en la calle Amana, Urb. La Trinidad.	491.048	ORDINARIO	TERMINADA	100%
161	09-45	Estabilización de Talud en Sector Santa Cruz del Este, las Dalías, Sector la Jungla, Municipio Baruta, Estado Miranda.	3.445.477	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
162	09-46	Estabilización de Talud en el Sector Picapiedra parte baja de la Limonera, Municipio Baruta, Estado Miranda.	2.886.288	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
163	10-05	Construcción de Cunetas y Aceras. Los Guayabitos Pasando La Estación De Servicio PDV. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	15%
164	10-09	Construcción de Caminerías en Las Minas de Baruta.	491.071	ORDINARIO	TERMINADA	100%
165	10-10	Construcción de escaleras y Caminerías en Barrio Santa Cruz del Este, Sector Trujillo entre Av. Río Paragua y Av. Río Manapire.	296.607	ORDINARIO	TERMINADA	100%
166	10-11	Construcción de escaleras en los callejones Caroní y Los Rosales, final Calle Unión, Sector Chupulún, Santa Cruz del Este.	317.096	ORDINARIO	TERMINADA	100%
167	10-13	Construcción de aceras y rampas de acceso en la Urb. Los Samanes.	317.606	ORDINARIO	TERMINADA	100%
168	10-14	Construcción de escalera en el sector Las Minitas, parte baja, de la Escalera N° 1.	192.084	ORDINARIO	TERMINADA	100%
169	10-15	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLE DEL COLEGIO AMERICANO, LAS MINAS.	307.473	ORDINARIO	TERMINADA	100%
170	10-16	Construcción de aceras y brocales en la Urb. Santa Rosa de Lima.	513.736	ORDINARIO	TERMINADA	100%



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

171	10-17	Construcción de aceras en la Av. de Las Minas, frente a las Qtas. Wallfidi, Ruende y depósitos de Ferrofer.	183.916	ORDINARIO	TERMINADA	100%
172	10-19	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BROCALES EN LA URBANIZACION PRADO DEL ESTE.	556.448	ORDINARIO	TERMINADA	100%
173	10-22	Construcción de aceras en la Urb. Cumbres de Curumo.	179.937	ORDINARIO	TERMINADA	100%
174	10-23	Construcción de aceras y brocales en la Urb. Lomas de Prados del Este.	498.450	ORDINARIO	TERMINADA	100%
175	10-24	Construcción y reparaciones menores de brocal y defensas en la Calle Suapure con Ramal 2, Urb. Colinas de Bello Monte.	357.143	ORDINARIO	EJECUCIÓN	5%
176	10-25	Construcción de aceras y brocales en la Calle Orinoco y Calle Guaire, Urb. Colinas de Bello Monte.	318.110	ORDINARIO	TERMINADA	100%
177	10-26	Construcción de aceras desde el Parque Res. Chulavista hasta la Calle Cerro Quintero, Urb. Chulavista.	318.242	ORDINARIO	TERMINADA	100%
178	10-27	Construcción de escaleras y Caminerías en Calle Unión, Sector San Rafael, Santa Cruz del Este.	271.860	ORDINARIO	TERMINADA	100%
179	10-28	Construcción de aceras en la Urb. El Placer.	291.496	ORDINARIO	TERMINADA	100%
180	10-31	Construcción de Aceras en la Urbanización Piedra Azul.	143.803	ORDINARIO	TERMINADA	100%
181	10-33	Construcción de aceras en la Urb. Santa Inés.	320.868	ORDINARIO	TERMINADA	100%
182	10-34	Construcción de escaleras y Caminerías en La Planada baja de Hoyo de La Puerta.	283.638	ORDINARIO	TERMINADA	100%
183	10-35	Construcción de aceras desde el Sector La Arenera hasta Ojo de Agua, parte alta.	320.308	ORDINARIO	TERMINADA	100%
184	10-45	Reparación y mejoras de escaleras del Sector Anacoco (3RA ESCALERA). Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
185	10-40	Rehabilitación Parcial de Aceras y Brocales. Urb. Chuao. Presupuesto Participativo.	803.571	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	15%
186	10-42	Construcción de Caminería. Calle El Rosario, (Callejón Los Claveles, Callejón Los Eucaliptos y Callejón Los Samanes) Sector El Rosario. Presupuesto Participativo.	892.857	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
187	10-47	Reparación de escalera y rampa. Sector Tito Salas. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
188	10-50	Aceras Avenida principal Santa Fe Sur. Presupuesto Participativo.	446.429	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
189	10-51	Reconstrucción de Caminerías. Calle Moisés Con Calle Josefina. Santa Cruz Del Este. Presupuesto Participativo.	267.857	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

190	10-53	Rehabilitación de Aceras en las Calles Ecuador - Perú - Calle Central Los Riscos. Terrazas Club Hípico. Presupuesto Participativo.	267.857	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
191	10-54	Rehabilitación de Aceras en las Av. Las Repúblicas - Las Américas y Bolivia. Presupuesto Participativo.	267.857	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	100%
192	10-57	Reparación de la Acera de la Av. Principal desde la entrada de la Urbanización hasta la Av. 1, en sentido subiendo. Av. Principal De Alto Prado. Presupuesto Participativo.	357.143	PARTICIPATIVO	EJECUCIÓN	5%
193	10-61	Reconstrucción de las Escaleras y Caminerías del Sector San José Escaleras 1 y 2. El Placer De María. Presupuesto Participativo.	625.000	PARTICIPATIVO	TERMINADA	100%
194	INSP-01	Inspección y Supervisión de la Obra Construcción del Gimnasio Vertical en Santa Cruz del Este. (4.04.14.01.00).	1.278.712	ORDINARIO	EJECUCIÓN	80%
195	INSP 02	Inspección para la Construcción del Centro de Protección de Control Animal CEPROCAN. (4.04.14.01.00)	322.538	ORDINARIO	EJECUCIÓN	50%
			156.001.568			


Fuente: Dirección de Infraestructura



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

De las ciento noventa y cinco (195) Obras estimadas para ser ejecutadas dentro del Plan Operativo Anual 2010 por la División de Construcción, se concluyeron ciento veintidós (122) obras, quedando setenta y tres (73) obras en proceso de ejecución, tal como se aprecia en la grafica:

Gráfico N° 11-07.VI: Estado de Obras de la División de Construcción frente a la Meta Propuesta, 2010

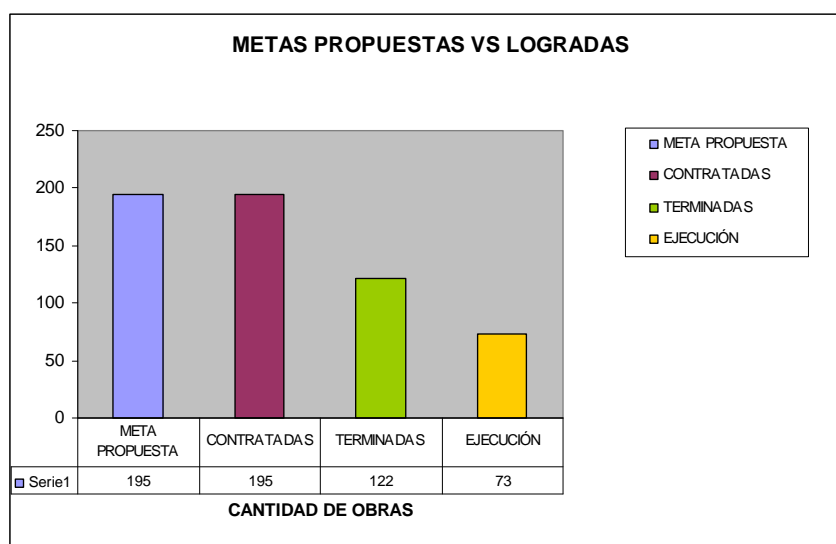

. Fuente: Dirección de Infraestructura

Durante 2010, se colocaron 56.849,69 toneladas de asfalto y 7.528,67 metros cúbicos de concreto en diferentes sectores del Municipio.

PORCENTAJE DE METAS LOGRADO:

El porcentaje de metas logrado por la División de Construcción en cuanto a Obras contratadas es de 93,75% y respecto a Obras culminadas en relación a las metas planteadas el porcentaje asciende al 58,17%, quedando en etapa de ejecución el 35,57%.

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

La división se encarga de garantizar el mantenimiento y mejoras a la infraestructura propia del Municipio, así como de coordinar con la comunidad las obras de autoconstrucción y calidad ambiental en materia de infraestructura, siguiendo



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

los criterios establecidos por la División referente al mantenimiento de las obras del Municipio Baruta. Además, debe tomar las previsiones para situaciones conflictivas como lo podrían ser derrumbes o deslizamientos de taludes, obstrucciones o roturas de tuberías, limpieza de quebradas, repavimentación, bacheo, limpieza de sumideros, bocas de visita, cunetas, torrenteras, retiro de vallas, pendones, pancartas ilegales, pintura de muros, fachadas y paredes, demarcación de pasos peatonales, reductores de velocidad, defensas viales, reparación de rejillas, colectores de aguas negras, tuberías de aguas blancas, limpieza de canales de agua de lluvia, etc.

Cuadro N° XII : Actividades realizadas por la División de Mantenimiento en el año 2010

	TIPO DE ACTIVIDAD	CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA
1	Recepción y Canalización de Denuncias con otros organismos	768
2	Recepción de Denuncias y Atención Directa por la Dirección	452
3	Colocación de Asfalto en Frío	6.831,45 M ² / 18.804 bolsas
4	Colocación de Asfalto en Caliente	1.000 Ton / 13.949,72 M ²
5	Limpieza de bocas de visita o tanquillas	17 Pzas
6	Limpieza de Cunetas, Torrenteras y Canales	145 M ³
7	Recolección de sedimentos	42.213,84 M ³
8	Retiros de vallas y/o pendones	519 Pzas
9	Pintura de Muros, Fachadas, Paredes y Otros.	25.324,3 M ²
10	Reparaciones varias	3.017 Pzas / 2.605 M ² / 83 M ³ / 669 ml
11	Colocación y/o reparación de Electricidad (Lámparas, bombillos, etc.)	124 Pzas
12	Reparaciones varias de Plomería	106 Pzas / 21 ml
13	Colocación de bocas de visita	80 Pzas
14	Limpieza con equipo tipo vactor	91 Pzas
15	Limpieza de sumideros de rejillas y/o ventana	243 Pzas
16	Reparación de sumideros rejillas/ventana	34 Pzas
17	Construcción, reparación, y/o demolición de aceras	25 M ² / 16 M ³
18	Construcción de brocales y/o canales	227 ml
19	Demolición de bases de concreto	22 M ² / 2 M ³
20	Cables instalados	40 ml
21	Demolición de Pavimento de Asfalto	78 M ³
22	Demarcación de pasos peatonales/zona escolar/reductores de velocidad	315 M ²



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

23	Demarcación de defensas viales (Concreto/Metálicas)	10 M ²
24	Reparación y/o colocación de Defensas	4 Pzas
25	Transporte y colocación de materiales, reconeco, piedras	0
26	Colocación de tapas de tanquillas / rejillas	0
27	Reparación de cercas	
28	Limpieza y/o reparación de canales de aguas de lluvias en edificaciones	14 ml
29	Canalización de aguas de manantial	0
30	Reparación de colectores de aguas negras	2 ml
31	Reparación y/o colocación de defensas	5 Pzas
32	Limpieza de quebradas	26 M ³
33	Construcciones varias (marcos de rejilla, losas, etc.	23 Pzas
34	Roleo y recolección de desechos vegetales	3 M ³

Cuadro N° XIII : Obras Contratadas por la División de Mantenimiento en el año 2010 / Ejecución Física

N°	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2010 Gasto	FUENTE FINANCIAMIENTO	CONTRATO MONTO (Bs.)	ESTADO CONTRATACIÓN	AVANCE FÍSICO
1	03-01	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación de bocas de visita y tanquillas) en el Sector 1.	491.071	ORDINARIO	476.998,75	TERMINADA	100%
2	03-02	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación de bocas de visita y tanquillas) en el Sector 2	491.071	ORDINARIO	479.712,82	TERMINADA	100%
3	03-03	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación de bocas de visita y tanquillas) en el Sector 3	491.071	ORDINARIO	478.802,26	TERMINADA	100%
4	03-04	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación de bocas de visita y tanquillas) en el Sector 5	491.071	ORDINARIO	478.683,78	TERMINADA	100%
5	03-46	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación de bocas de visita y tanquillas) en la Urb. Santa Inés.	625.000	ORDINARIO	468.257,95	TERMINADA	100%
6	03-85	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación de bocas de visita y tanquillas) en el Sector 4	491.071	ORDINARIO	481.780,94	TERMINADA	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

7	04-01	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, desde cruce con Av. Del Hatillo hasta la Urb. Coracrevi y Qda. Los Mangos.	491.071	ORDINARIO	378.201,61	TERMINADA	100%
8	04-02	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita desde la Urb. La Bonita hasta Parque La Trinidad.	491.071	ORDINARIO	356.627,34	TERMINADA	100%
9	04-03	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, Sector Llano Verde.	491.071	ORDINARIO	175.335,40	TERMINADA	100%
10	04-04	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, Sector Puente Los Naranjos vía Cementerio del Este.	491.071	ORDINARIO	172.578,02	TERMINADA	100%
11	04-05	Conservaciones y mejoras en la Quebrada El Peñón, entre final Calle Caripe de la Urb. El Peñón y Av. El Parque de la Urb. Prados del Este.	491.071	ORDINARIO	376.361,99	TERMINADA	100%
12	04-06	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Manzanares, Casco de Baruta.	491.071	ORDINARIO	490.591,23	TERMINADA	100%
13	04-07	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Sartenejas, desde Piedra Azul hasta Bloques de La Trinidad.	491.071	ORDINARIO	481.190,05	TERMINADA	100%
14	04-08	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Ojo de Agua, desde Capuy hasta La Arenera, Sector Ojo de Agua.	982.143	ORDINARIO	573.620,37	TERMINADA	100%
15	04-09	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Boyera, desde el CIED hasta la Urb. Las Esmeraldas y Calle Cangilón, Urb. La Tahona.	491.071	ORDINARIO	378.489,57	TERMINADA	100%
16	04-10	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Sorocaima, entre los Bomberos de La Trinidad y Procter and Gamble.	491.071	ORDINARIO	490.544,40	TERMINADA	100%
17	04-14	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Calle La Ceiba, Urb. El Peñón	437.500	ORDINARIO	256.992,70	TERMINADA	100%
18	04-15	Conservación y mejoras en la Quebrada Manzanares, Av. Principal (Parque El Clavito) y final Parque Francisco Tamayo	491.071	ORDINARIO	485.342,55	TERMINADA	100%
19	04-16	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Chua, entre Av. Raúl Leoni (Boulevard El Cafetal, y Calle La Escuela) hasta la Av. Río de Janeiro, pasando por Calle Las Lomas.	491.071	ORDINARIO	253.814,09	TERMINADA	100%
20	04-21	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Los Campitos.	491.071	ORDINARIO	401.784,45	TERMINADA	100%
21	04-25	Conservaciones y mejoras en el Canal Marginal, Santa Rosa de Lima.	357.143	ORDINARIO	350.036,16	TERMINADA	100%



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

22	04-26	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 5).	491.071	ORDINARIO	426.949,37	TERMINADA	100%
23	04-28	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 4).	491.071	ORDINARIO	481.285,84	TERMINADA	100%
24	04-30	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 3).	491.071	ORDINARIO	487.368,50	TERMINADA	100%
25	04-31	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 2).	491.071	ORDINARIO	353.249,02	TERMINADA	100%
26	04-32	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 1).	491.071	ORDINARIO	489.176,35	TERMINADA	100%
27	04-33	Conservaciones y mejoras en el Canal Marginal de Las Mercedes. PLUSVALIA	491.071	ORDINARIO	306.573,62	TERMINADA	100%
28	04-34	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Baruta desde Urb. Los Naranjos hasta la Av. Río de Janeiro.	491.071	ORDINARIO	482.103,96	TERMINADA	100%
TOTAL			14.187.453,08		11.512.453,08		

Fuente: Dirección de Infraestructura

Cuadro N° XIV : Beneficios a la Comunidad, 2010

BENEFICIOS	CANTIDAD
TOTAL EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	560
TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	1680
URBANIZACIONES BENEFICIADAS	112
POBLACIÓN BENEFICIADA	500.000 hab

Fuente: Dirección de Infraestructura

OTRAS ACTIVIDADES:

• **ATENCIÓN A SECTORES POPULARES Y ZONAS RURALES, SERVICIO DE AGUA**

Este servicio que presta la Alcaldía de Baruta a través de la Dirección de Infraestructura, es de gran relevancia debido a la recurrente falta del vital líquido en las áreas del Sur-Este Caraqueño y a la decisión de la empresa Hidrocapital de restringir la programación de distribución de agua potable por la escasez de agua en los embalses que surten a la capital.

Se benefició un número aproximado de cuarenta y seis (46) sectores populares del Municipio Baruta.



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

Se realizaron un total de ciento noventa y cinco (195) jornadas de limpieza y baldeo con cisternas, luego de los desbordamientos de quebradas y deslizamientos de tierra.

Se continuó con el Programa de Riego de áreas Verdes establecido en la temporada de sequía en diferentes sectores del Municipio.

En el año 2010, se distribuyeron de forma gratuita la cantidad de 16.724.287 litros de agua aproximadamente, a razón de 321.620,9 litros promedio por semana.

Cuadro N° 11-07.V: Programa de distribución de Agua en el Municipio Baruta, 2010

N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CANTIDAD DE LITROS DISTRIBUIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	N° DE SECTORES BENEFICIADOS
2596	16.724.287,00	10.384	46

PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN: OBJETIVO Y ALCANCE

El Programa de Auto Construcción tiene como objeto principal dirigir, controlar , supervisar e inspeccionar todas aquellas actividades concernientes a la solicitudes de materiales para la construcción y reparación de Obras, que contribuyan con el desarrollo de las comunidades a través de sus Asociaciones de Vecinos, Asociaciones Civiles, Grupos de Vecinos y Juntas Comunales procurando así el bienestar de sus habitantes., en este sentido a través de la autoconstrucción las comunidades podrán realizar sus actividades de manera conjunta, contribuyendo ellos mismos en la solución de sus problemas básicos, como lo son: Reparación de Escaleras, Construcción de Muros de Contención, Reparación de Tuberías de Aguas Negras y/o Aguas Blancas, Drenajes, Recolección de Escombros, Labores de Pintura, Espacios Públicos, Deslizamientos de Tierra y cualquier otra actividad que de alguna manera afecte a su comunidad, todo ello de manera conjunta y a través de la prestación de asesoría técnica y la entrega de materiales para las obras a ejecutar en los sectores del municipio que así lo amerite.

A continuación se detalla el avance del Programa de Autoconstrucción durante el año 2010:

Cuadro N° 11-07.VI : Obras del Programa de Autoconstrucción en el Municipio Baruta, 2010

N°	Obra	Sector Beneficiado	N° familias beneficiadas	Parroquia / fecha ejecutada	Monto en Bs.
1	Continuación de Pavimentado, Calle La Salsa , Hoyo de La Puerta	Calle la Salsa de Hoyo de La Puerta , Baruta	56 x un promedio de 4 Personas	Nuestra Señora del Rosario de Baruta	3.298,66.
2	Reparación depósito de basura	Sector la Peña, k15	23 x un Promedio	Nuestra Señora del Rosario de	2.206,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

		Autopista Regional del Centro, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Baruta	de 3 personas	Baruta	
3	Continuación de Construcción de una gruta para la virgen del sector	Sector Piedras Azules, Hoyo de la Puerta	25 x un Promedio de 3 personas	Nuestra Señora del Rosario de Baruta	1.601,11
4	Reparación de la calle principal, .	Sector la Eneca, Calle San José K 14.	15 x un promedio de 4 personas	Nuestra Señora del Rosario de Baruta	4.634,00
5	Continuación de la pavimentación de la calle principal el manguito.	Sector el Maguito, las Lomas, Hoyo de la Puerta.	35 x un Promedio de 4 personas	Nuestra Señora del Rosario de Baruta	5.742,00
6	Reparación de la Calle Principal, Filas de Chicura	Sector Chicura Calle Principal, las Lomas Hoyo de la Puerta.	16 x un promedio de 10 personas	Nuestra Señora del Rosario de Baruta	4.175,00
7	Continuación en la construcción de Recolector de aguas negras.	Calle Morgado con Calle Arismendi, Sector Hoyo de la Puerta.	45 x x un promedio de 15 personas	Nuestra Señora del Rosario de Baruta	13.084,50
8	Reparación de escaleras y Caminería	Sector las Minutas parte alta, Escalera n 11,	25 x x un promedio de 12 personas	Nuestra Señora del Rosario de Baruta	1.627,00
9	Reparación de tuberías aguas blancas	Sector San Pedrito, Carretera Principal.	23 x x un promedio de 12 personas	Nuestra Señora del Rosario de Baruta	796,00
10	Reparación de Caminería,	Sector el Placer, Escaleras n 2.	12 x x un promedio de 5 personas	Nuestra Señora del Rosario de Baruta	350,00
11	Reparación muro de contención	Calle Principal, Sector Copey	45 x x un promedio de 25 personas	Nuestra Señora del Rosario de Baruta	5.076,00
12	Reparación de Talud, por deslizamiento	Sector Valle Verde, la Pared, Hoyo de la Puerta	42 x x un promedio de 12 personas	Nuestra Señora del Rosario de Baruta	5.614,00

Fuente: Dirección de Infraestructura

TOTAL BS. 843.408,33

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN APOYO A OTRAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA ALCALDÍA DE BARUTA
ASI COMO DE OTRAS INSTITUCIONES.**

- Dirección de Desarrollo Social, Remodelación de Hogar Comunitario, Ojo de Agua.
- Dirección de Educación, construcción de brocal en concreto para cercado malla tipo ciclón en U.E.M.R. Aquilez Naoa, sector Hoyo de La Puerta, calle Principal.
- Dirección de Educación, Trabajos de electricidad en U.E.M.R. Germán Ubaldo Lira, sector Las Minas.
- Dirección de Educación, Trabajos de electricidad en U.E.M.R. Manuelita Saenz, sector La Planada.



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

- Dirección de Educación, Trabajos de electricidad en U.E.M.R. Miguel Otero Silva, Urb. Parque Humboldt.
- Dirección de Salud, trabajos de albañilería en Sede del Centro de Protección y Control Animal (CEPROCAN), entrada a la Urb. Coracrevi.
- Policía Municipal de Baruta, construcción de tanquillas de aguas negras, Módulo de la Urb. Chuao.
- Policía Municipal de Baruta, limpieza de tanquillas y destape de tuberías, Piedra Azul.
- Oficina de Las Mercedes, reparación de bolardos de concreto en Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes.
- Dirección de Desarrollo Social, Pintura en fachadas, Centro Comunitario de Las Minas.
- Dirección de Áreas Verdes, roleo de árbol, Urb. Parque Humboldt.
- Junta Parroquial del Cafetal, trabajos de plomería, Urb. El Cafetal.
- Dirección de Deportes, reparación de colector de drenajes, sector Las Minas.
- Dirección de Administración y Servicios, traslado de muebles, antigua sede de La Alcaldía de Baruta, Urb. Colinas de Bello Monte hacia el Módulo de Servicios “Adelita Calvanis”, Ojo de Agua.
- Dirección de Desarrollo Social, limpieza de canales de recolección de aguas de lluvia, Módulo de Servicios “Adelita Calvanis”.
- Dirección de Educación, destape de tubería de aguas de lluvia con equipo de varillaje, Baruta, calle Sucre U.E.M.R. Monseñor Lucas Castillo”.
- Dirección de Deportes, colocación de torre, sector Santa Cruz del Este, callejón San Rafael.
- Policía Municipal de Baruta, demolición de banco de concreto, Urb. Chuao, Módulo de la Urb. Chuao.
- Dirección de Deportes, destape con equipo de varillaje, Urb. Santa Fe Norte “Polideportivo Boris Piñero”.
- Dirección de Educación, trabajos de albañilería y plomería (reparación de colector), sector Las Minas, U.E.M.R. “Germán Ubaldo Lira”, sector Las Minas.
- Dirección de Salud, retiro de pieza sanitaria, Urb. Coracrevi, Av. La Guairita, sede del Servicio de Protección y Control Animal (CEPROCAN).
- Dirección de Deportes, trabajos de plomería (reparación de tubería de aguas negras), Urb. Los Samanes, Polideportivo El Naranjal.
- Dirección de Educación, trabajos de albañilería (reparación de filtración), Baruta, calle Páez, U.E.M.R “Miguel José Sanz”.
- Dirección de Desarrollo Social, trabajos de pintura, Urb. Colinas de Bello Monte, sede de Registro Civil.



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

- Dirección de Cultura, desmontaje de techo de lámina Metálicas (tipo acerolit) y piezas de piso, Baruta, calle Sucre, Casa de La Cultura.
- Dirección de Desarrollo Social, trabajos de electricidad, sector Hoyo de Puerta, Piedras Azules.
- Dirección de Salud, trabajos de electricidad, sector Hoyo de Puerta, Las Lomas.
- Dirección de Educación, trabajos de plomería, sector Hoyo de La Puerta, La Planada, U.E.M.R “Manuelita Saenz”.
- Dirección de Administración y Servicios, colocación de baldosas, Baruta, sede de la Alcaldía de Baruta.
- Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Deportes, trabajos de pintura, Urb. Terrazas del Club Hípico, campo deportivo Los Criollitos.
- Junta Parroquial de Las Minas, entrega de tuberías, sector Las Minas.
- Dirección de Deportes, trabajos de herrería, Urb. Terrazas del Club Hípico, Campo Deportivo La Ciudadela.
- Dirección de Deportes, limpieza de sumidero de rejilla con camión , Urb. Terrazas del Club Hípico, Campo Deportivo La Ciudadela.
- Dirección de Deportes, trabajos de pintura, Urb. Terrazas del Club Hípico, Campo Deportivo La Ciudadela.
- Dirección de Salud, trabajos de pintura, Av. La Guairita, sede del Servicio de Ambulancia Baruta (SERBA).
- Dirección de Educación, limpieza de sumidero de rejilla, sector Las Minas, U.E.M.R. “Germán Ubaldo Lira”.
- Dirección de Deportes, trabajos de plomería, Urb. Las Mesetas, calle El Parque “Polideportivo Las Mesetas”.
- Dirección de Deportes, limpieza de sistemas de drenajes, Urb. Alto Prado, Polideportivo Cesar del Veccio”
- Dirección de Educación, destape de tanquillas de aguas servidas y demolición de losa de concreto, Las Minas, U.E.M.R. “Germán Ubaldo Lira”.
- Dirección de Cultura, trabajos de electricidad, Concha Acústica, Urb. Colinas de Bello Monte.
- Dirección de Cultura, recolección de sedimentos, Concha Acústica, Urb. Colinas de Bello Monte
- Registro Civil, trabajos de pintura, Urb. Colinas de Bello Monte, antigua sede de la Alcaldía de Baruta.
- Dirección de Desarrollo Social, trabajos de herrería (reparación de canales metálicas para recolección de aguas de lluvia, sector Ojo de Agua, carretera principal, Módulo de Servicio Adelita de Calvani.
- Contraloría Municipal, trabajos de albañilería, Urb. Lomas de La Trinidad, calle Santa Elena, sede de la Contraloría Municipal.
- Dirección de Salud, trabajos de plomería, Baruta, sede de la Alcaldía de Baruta.
- Dirección de Desarrollo Social, trabajos de electricidad, sector La Palomera, Hogar Comunitario.
- Registro Civil, trabajos de electricidad, Urb. Colinas de Bello Monte, antigua sede de la Alcaldía de Baruta.



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

- Dirección de Salud, construcción de sumidero de rejas, sector Santa Cruz del Este.
- Policía Municipal de Baruta, traslado de Mobiliario, variante de Piedra Azul, sede de la Policía Municipal de Baruta.
- Módulo de la Policía Municipal de Baruta, trabajos de pintura, variante de Piedra Azul, sede de la Policía Municipal de Baruta.
- Dirección de Educación, trabajos de plomería, sector Santa Cruz del Este.
- Dirección de Áreas Verdes, recolección de desechos vegetales.
- Dirección de Educación, trabajos de colocación de canales de aguas de lluvia, sector Hoyo de La Puerta, La Planada, U.E.M.R "Manuelita Saenz".
- Dirección de Educación, trabajos de electricidad, sector Hoyo de La Puerta, La Planada, U.E.M.R "Manuelita Saenz".
- Dirección de Salud, trabajos de herrería, sector Las Minas, Ambulatorio "José María Vargas".
- Dirección de Deportes, trabajos de herrería en reparación de Puertas, sector Ojo de Agua, La Arenera, canchas deportivas.
- Dirección de Desarrollo Social, trabajos de pintura (impermeabilizante), sector Hoyo de La Puerta "Hogar Comunitario".
- Dirección de Desarrollo Social, limpieza de techo, Urb. La Trinidad, Polideportivo "Rafael Vidal" , donde está la Defensoría de Derechos de la Mujer.
- Dirección de Áreas Verdes, trabajos de herrería (reparación de vallas), Urb. La Tahona, sede de Áreas Verdes.
- Registro Civil, demolición de tabique "Dry wall", Urb. Colinas de Bello Monte, antigua sede de la Alcaldía de Baruta.
- Dirección de Áreas Verdes, rehabilitación de botadero de basura con concreto, sector Ojo de Agua, La Arenera.
- Junta Parroquial del Cafetal, trabajos de electricidad, cambio de cableado, Urb. El Cafetal.
- Dirección de Salud, desmontaje de Puerta, Baruta, sede principal de la Alcaldía de Baruta.
- Dirección de Administración y Servicios, trabajos de electricidad (sustitución de cableado), Urb. Colinas de Bello Monte, antigua sede de la Alcaldía de Baruta.
- Dirección de Administración y Servicios, traslado de planta eléctrica.
- Dirección de Desarrollo Social, construcción de pared, sector Ojo de Agua, carretera principal, Módulo de Servicio Adelita de Calvani.
- Dirección de Educación, trabajo de electricidad (sustitución de luminarias y cableado), sector Ojo de Agua, "Preescolar El Carmen".



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

- Contraloría Municipal, trabajos de albañilería, Urb. Lomas de La Trinidad, calle Santa Elena, sede de la Contraloría Municipal.
- Dirección de Salud, trabajos de plomería en La Guairita, sede de Servicio de Ambulancias de Baruta (SERBA).
- Dirección de Cultura, trabajos de recolección de sedimentos, Concha Acústica, Urb. Colinas de Bello Monte.
- Dirección de Cultura, trabajos de baldeo, Concha Acústica, Urb. Colinas de Bello Monte.
- Junta Parroquial del Cafetal, trabajos de plomería (sustitución de tubería de aguas blancas), Urb. El Cafetal.
- Dirección de Deportes, trabajos de pintura, Urb. Santa Ana, calle Cumaná, Estadio "Vidal López"
- Dirección de Deportes, trabajos de electricidad, Urb. Santa Ana, calle Cumaná, Estadio "Vidal López".
- Dirección de Deportes, trabajos de plomería (instalación de bebedero), Urb. Santa Ana, calle Cumaná, Estadio "Vidal López".
- Dirección de Desarrollo Social, trabajos de electricidad (sustitución de focos), sector Ojo de Agua, carretera principal, Módulo de Servicio Adelita de Calvani.

DIVISIÓN DE PROYECTOS

Esta división se encarga de definir los proyectos necesarios a mediano, corto y largo plazo, destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el aspecto de la infraestructura propia del Municipio Baruta. Para ello, coordina la realización de proyectos necesarios para la construcción y/o mantenimiento de las obras del Municipio, prepara y conforma toda la documentación técnica requerida para la formalización de los contratos de estudios y proyectos de obras, mantiene actualizada la información relacionada con el inventario de la infraestructura municipal y hace seguimiento e inspecciona los contratos de proyectos de obras durante su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el contrato, especificaciones técnicas y la normativa legal vigente.

ACTIVIDADES

Se inició del proceso de contratación de los Estudios y Proyectos previstos en el Presupuesto 2010 Inspección y revisión de los Estudios y Proyectos contratados.

Se brindó apoyo a las Divisiones de Mantenimiento y Construcción en la inspección de denuncias de deslizamientos y evolución de los proyectos en obra.




Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Cuadro N° 11-07.VII : Resumen de la Ejecución de Proyectos, 2010

TIPO DE PROYECTO	CANTIDAD	% DE AVANCE
Hidráulicos	31	100
Estructura	2	100
Estabilizaciones de Taludes	47	100
Fallas de Borde	7	100
TOTAL	87	

Fuente: Dirección de Infraestructura

Gráfico N° 11-07.VII: Categorías de Proyectos, 2010

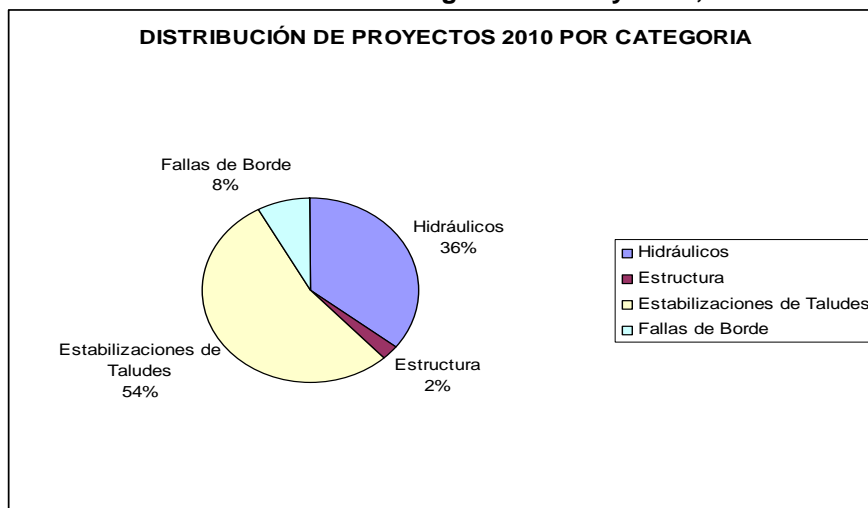



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura


Fuente: Dirección de Infraestructura

Cuadro N° 11-07.VIII: Resumen de la Ejecución de proyectos según Fuente de Financiamiento, 2010

TIPO DE PROYECTO	CANTIDAD	MONTO	% DE AVANCE
Presupuesto Ordinario	48	2.666.776,30	100
Presupuesto Participativo	39	1.971.699,77	100
TOTAL	87	4.638.476,07	

Fuente: Dirección de Infraestructura

Gráfico N° 11-07.VIII Ejecución de proyectos según fuente de financiamiento

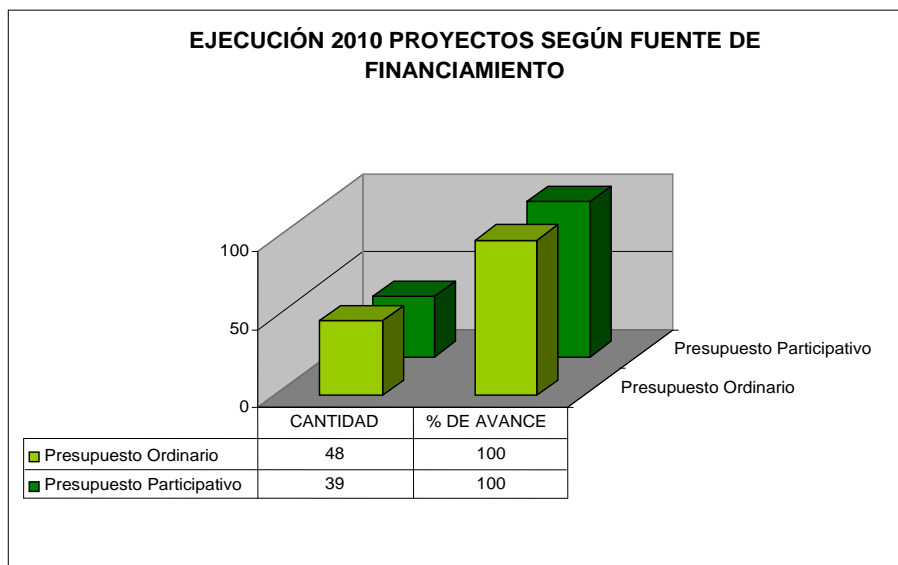

Fuente: Dirección de Infraestructura



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

Cuadro N° 11-07.XIX: Beneficios a la Comunidad, 2010

BENEFICIOS	CANTIDAD
TOTAL EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	450
TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	1350
URBANIZACIONES BENEFICIADAS	27
POBLACIÓN BENEFICIADA	500.000 Hab

Fuente: Dirección de Infraestructura

Cuadro N° 11-07.XX: Créditos Adicionales, División de Proyectos. Año 2010

	CANTIDAD	MONTO
CRÉDITOS ADICIONALES SOLICITADOS Y APROBADOS EN EL 2010	11	909.699,96

Fuente: Dirección de Infraestructura

DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

Esta división es la responsable de coordinar, controlar, documentar y resguardar los contratos de obras, mantenimiento, estudios, proyectos e inspecciones ejecutados por la Dirección de Infraestructura, incluyendo la preparación de los contratos con las empresas contratistas y firmas personales que ejecutan trabajos de ingeniería, inspección y revisión de los recaudos requeridos para contratar con la Alcaldía de Baruta y ser el custodio de todos los expedientes relacionados con los contratos. Para ello, asegura que todos los procesos de contratación cumplan con lo establecido en la Ley de Contrataciones vigente y su reglamento; prepara y verifica que los contratos contengan los recaudos y anexos de acuerdo a su tipo (inspección, estudios, proyectos y obras) y consolida y verifica los recaudos entregados por las contratistas para asegurar el cumplimiento del trámite.



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Cuadro N° 11-07.XXI : Meta de Contrataciones, Año 2010

METAS EN CONTRATACIONES	CANTIDAD	MONTO CONTRATADO BS.
CONCURSOS ABIERTOS REALIZADOS EN 2010	06	14.645.801,39
CONCURSOS CERRADOS REALIZADOS EN 2010	39	47.977.328,24
CONSULTAS DE PRECIOS REALIZADAS EN 2010	176	76.233.472,16
ADJUDICACIONES DIRECTAS	89	5.138.910,21
TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS	310	143.995.512,37

Fuente: Dirección de Infraestructura

Cuadro N° 11-07.XXII: Resumen de Contratos, Año 2010

N°	Actividad	Cantidad	Monto Contratado (Bs.)
1	Total Obras 2010:	154	103.943.674,90
2	Proyectos De Ingeniería Contratados:2010	70	3.871.793,34
3	Contratos De Inspección Firmados 2010	2	1.601.250
4	Obras Contratadas En Años Anteriores	84	34.578.793,98
	Total Contratos Incluidos En Presupuesto 2010	310	143.995.512,37
5	Economías En Contratos Del Presupuesto 2010		32.416.674,00
	Obras No Contratadas	13	9.831.556,00
	Total Presupuesto Final 2010		186.243.742,37

Fuente: Dirección de Infraestructura
